



□ **공약달성 확인지표**


확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
연 도 별 재 조 성	개소	목표	8	-	2	2	2	2	정상추진
		실적	4	-	4	-	-	-	

□ **추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새말어린이공원 재조성 사업 완료 / '23. 5.</li> <li>○ 통매바위, 다정, 여태말 어린이공원 재조성 사업 완료 / '23. 11. ~ 12.</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 증척골어린이공원 실시설계 용역 추진 중 / 24. 1. ~ 4.(주민의견수렴 및 설계추진)</li> </ul>



새말어린이공원(사업 전)

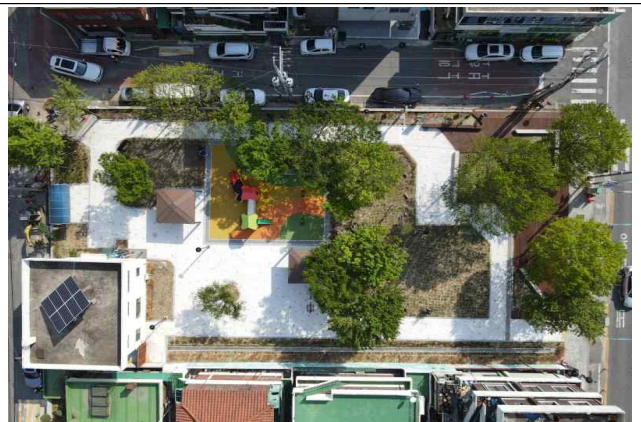


새말어린이공원(사업 후)




통매바위어린이공원(사업 전)




통매바위어린이공원(사업 후)

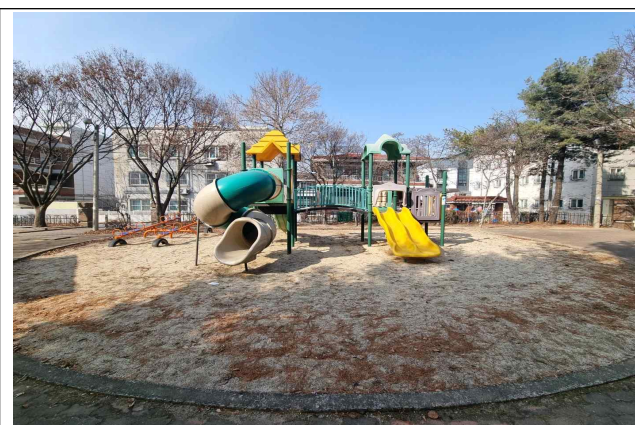


여태말어린이공원(사업 전)

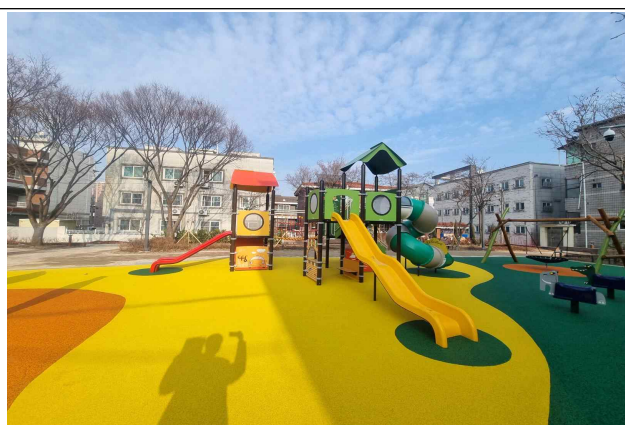

여태말어린이공원(사업 후)

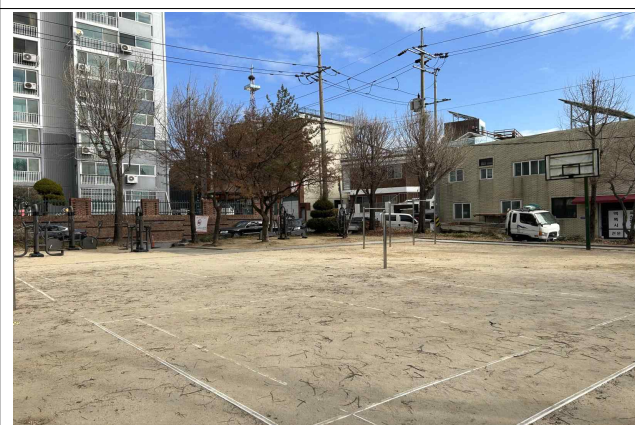

다정어린이공원(사업 전)

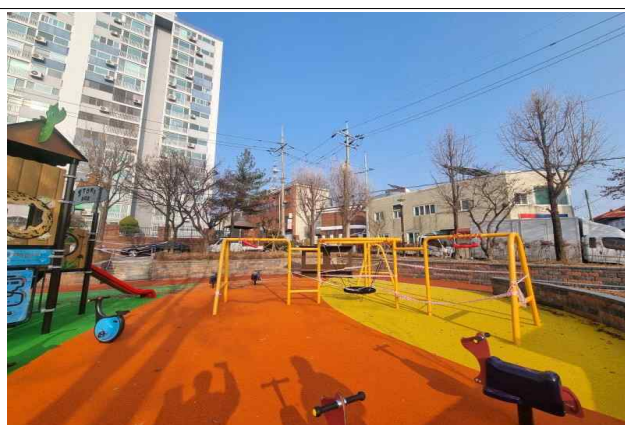

다정어린이공원(사업 후)

**향후 계획**

- '24. 3. ~ 5. : 경관심의 신청 및 행정절차 이행
- '24. 5. ~ 9. : 본 공사 추진
