

공약달성 확인지표


확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
지체장애인이전 및 사무실 이전 센터 개설	개소	목표	2	-	-	2	-	-	정상추진
		실적	1	-	1	-	-	-	
시각장애인단체 사무실 개설	개소	목표	1	-	-	-	1	-	정상추진
		실적	0	-	-	-	-	-	

추진실적


그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지체장애인협회 사무실 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 예산 확보('22. 4분기) - 지장협 사무실 임대계약, 선진지 견학('23. 2분기) - 지장협 사무실 리모델링 공사 착공('23. 3분기) 및 준공(23.4분기) ○ 장애인쉼터 개설 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인쉼터예정지 임대계약('23. 2분기) - 장애인단체 관련자 현장방문 및 사업설명, 의견수렴('24. 2분기) - 리모델링사업 예산확보('24. 2분기)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인쉼터 개설 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인쉼터 설계 용역 중



지체장애인협회 사무실

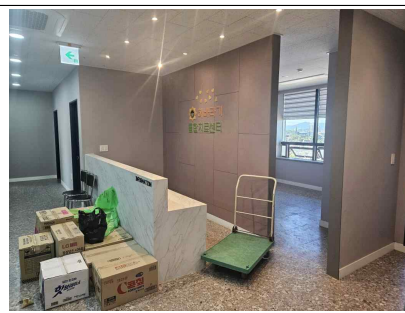

장애인쉼터 예정지

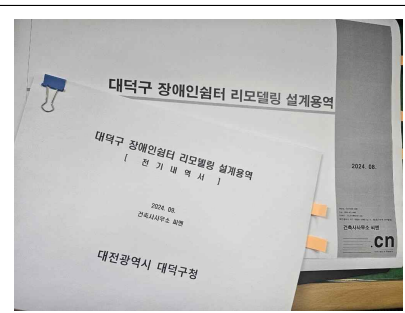

장애인쉼터 설계도(안)

문제점 및 대책

- 장애인쉼터 개소 후 운영 활성화 대책 마련 - 차년도 예산확보 필요

향후 계획

- 2024. 10월 중 장애인쉼터 설계 용역 준공
- 2024. 10. ~ 2024. 11. 장애인쉼터 리모델링공사 및 물품취득
- 2024. 12. 장애인쉼터 및 시각장애인협회 대덕지회 사무실 개소(예정)
