

관리번호 5-8	걸어서 만나는, 권역형 어린이공원 조성
-------------	------------------------------

주관부서	공원녹지과	공원조성팀장 김선화 ☎ 608-5111	담당자 김민주 ☎ 608-5112
------	-------	-----------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행률 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기후	23~29년	자체	부	×	5,600		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

사업현황 및 정책목표

○ 어린이 놀이공간 확충 및 시설물 안전·방역 강화를 통한 놀이환경 개선

사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 사업내용 : 어린이공원 재조성 8개소 / 지역여건, 이용형태, 노후정도 등 고려
- 정비방향 : 정비개념 변화(도시재생 공원 클러스터화), 차별화된 맞춤형 공원시설

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
어린이공원 재조성	실시설계용역 및 행정절차			■	■			■				■				■			■
	본공사 추진 및 완료				■	■			■	■			■	■		■	■		■

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	5,600	3,680	0	920	920	920	920	1,920	3,410	3,377
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	2,856	1,876	0	469	469	469	469	980	1,827	1,924
구비	2,744	1,804	0	451	451	451	451	940	783	668
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	800	785

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
연도별 재조성	개소	목표	8	-	2	2	2	2	이행후 계속추진
		실적	7	-	4	1	2	-	


추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 새말, 통매바위, 다정, 여태말어린이공원 재조성사업 완료 - 4개소 조성 / 집행 1,450백만원 ○ 2024년 증척골어린이공원 재조성사업 완료 - 1개소 조성 / 집행 429백만원 ○ 2025년 노촌, 상수골어린이공원 재조성사업 착공 - 2025. 7. ~ / 2개소 조성추진 / 집행
----------------	--

이번 분기 추진 실적	<p><노촌어린이공원></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 11. 17. : 준공 <p><상수골어린이공원></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 11. 23. : 준공
----------------------	--



노촌어린이공원 재조성사업 조성사진

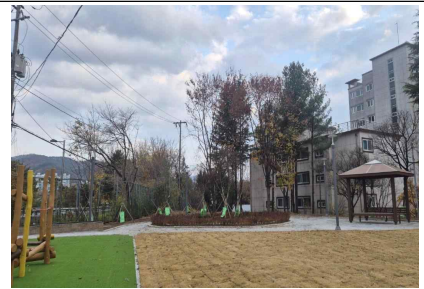

상수골어린이공원 재조성사업
조성사진

향후 계획

- 공사완료에 따른 지속적인 유지·관리 철저
