

관리번호 1-5	신탄진역 서측 주차환경 개선
-------------	------------------------

주관부서	교통과	주차시설팀장 김관수 ☎ 608-5291	담당자 안강식 ☎ 608-5292
------	-----	-----------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~25년	자체	신규	×	4,322			○				20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한()							

사업현황 및 정책목표

- 신탄진역 및 신탄진 시장 이용객 편의를 위한 서측 주차공간 조성

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 기 사용중인 신탄진역을 충청권 광역철도 역사로 이용함에 따라 이용객이 증가할 것으로 예상됨, 이에 따른 편의성 증진을 위하여 신탄진역 서측 주차공간 조성

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
신탄진역 서측 주차환경 개선	타당성 조사 용역																		
	용역 및 공사 추진																		
	보조금 정산																		

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액 (예산편성액)	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	4,322	4,322	0	22	4,300	0	0	0	22	20
국비	2,580	2,580	0	0	2,580	0	0	0	0	0
시비	860	860	0	0	860	0	0	0	0	0
구비	882	882	0	22	860	0	0	0	22	20
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ (관리번호 1-4) "충청권 광역철도 한남대역 주변 공영주차장 조성" 사업과 용역 통합 추진


공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
공영주차장 조성	개소	1																1		

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.) ○ 타당성 조사용역 중간보고회 개최('23.09.12.)
----------	--

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.)
-------------	---

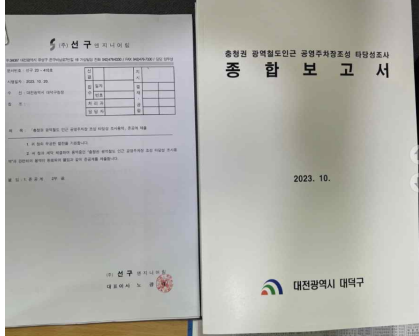

타당성 조사용역 준공('23.10.20.)

문제점 및 대책

- '23.10.20. 타당성 조사용역 중간보고회 결과 신탄진역 인근 주차장은 노외 주차장으로 결정하였으나,
- 조성사업비가 20억소요됨에 따른 사업비 확보가 필요한 실정임.
- 구비사업으로 추진하기에는 재정여건 상 어려운 상황이기에 공모사업 등 사업비 확보를 위해 각별히 노력하고자 함.

향후 계획

- 2024. 01. ~ 12. : 공모사업 등 사업 신청
- 2025. 01. ~ 2027. 12. : 공사 추진
