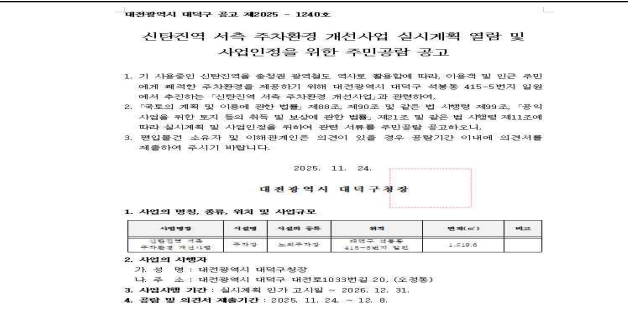
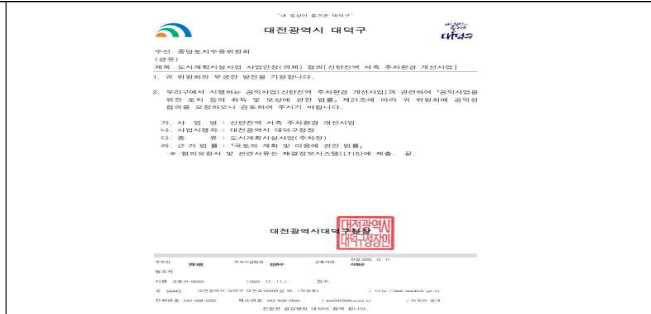


□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

□ 추진실적

기간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사용역 추진('23.02.~'23.10.) ○ 타당성 조사용역 중간보고회 개최('23.09.) ○ 도시관리계획(주차장) 결정(변경) 요청('24.11.) / 區→市 ○ 재정비촉진지구 기반시설 설치비 지원 요청('25.02.) / 區→市(불가) ○ 區 투자심사(원안의결)('25.04.) ○ 2025년 도시재정비위원회 심의('25.04.) ○ 도시관리계획(주차장) 결정(변경) 고시('25.06.) / 市고시 제2025-145 ○ 2025년 제2회 추경예산(1,560백만원) 반영('25.06.) / 실시설계 및 보상비 ○ 실시설계용역 착수('25.07.)
이벤 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시계획인가를 위한 관계부서 협의('25.11.) ○ 토지소유자 의견청취 및 주민공람공고('25.12.) ○ 중앙토지수용위원회 사업인정(의제) 협의('25.12.)

 <p>주민공람공고('25.12.)</p>	 <p>중토위 사업인정(의제) 협의('25.12.)</p>
--	--

□ 향후 계획

- '26. 01. : 실시계획인가 고시
- '26. 02. ~ 12. : 보상·공사 추진
